

Da Nang University of Science and Technology

QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA DỰ ÁN

THÀNH VIÊN

ĐẶNG HỮU LONG

NGUYỄN TRẦN CÔNG HỮU ĐẠT

NGUYỄN QUỐC DUY

TRẦN TÂM NHƯ



NỘI DUNG

1. KHÁI NIỆM RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO
2. NGUYÊN NHÂN VÀ TÍNH CHẤT RỦI RO
3. VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ RỦI RO
4. CÁC CÔNG VIỆC VÀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO
5. CÁC TÌNH HUỐNG RỦI RO THƯỜNG GẶP
6. CÔNG CỤ VÀ LƯU Ý TRONG QUẢN LÝ RỦI RO
7. TỔNG KẾT VÀ THÀNH QUẢ



1. KHÁI NIỆM RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

RỦI RO LÀ GÌ?

Là những sự kiện không mong muốn, có thể cản trở việc đạt được các mục tiêu của dự án, gây ra trì hoãn, vượt chi phí, hoặc giảm chất lượng sản phẩm.





QUẢN LÝ RỦI RO LÀ GÌ?

Là một quy trình có hệ thống nhằm xác định, phân tích, đánh giá, và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình thực hiện dự án, với mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực và tăng khả năng đạt được mục tiêu dự án.



2. NGUYÊN NHÂN VÀ ĐẶC ĐIỂM RỦI RO



Con người

Thiếu kỹ năng, giao tiếp kém hoặc thay đổi nhân sự có thể làm chậm tiến độ dự án.

Phạm vi và yêu cầu

Yêu cầu không rõ ràng hoặc thay đổi liên tục dễ làm dự án bị lệch mục tiêu.

Kế hoạch và quản lý

Lập kế hoạch chưa sát thực tế có thể gây trễ hạn và vượt chi phí.

Tài chính

Thiếu ngân sách hoặc phát sinh chi phí ngoài dự kiến làm ảnh hưởng việc triển khai.

Kỹ thuật và công nghệ

Công nghệ không phù hợp hoặc hệ thống lỗi có thể làm gián đoạn công việc.

Nhà cung cấp và đối tác

Chậm bàn giao hoặc chất lượng đầu vào kém sẽ ảnh hưởng tiến độ dự án

Yếu tố bên ngoài

Biến động thị trường, chính sách hoặc thiên tai có thể tác động ngoài kiểm soát

Thời gian

Thời hạn quá gấp hoặc tiến độ các khâu không đồng bộ dễ gây chậm toàn dự án.



Đặc điểm của rủi ro

01

Xảy ra trong tương lai: có thể là hậu quả của những việc làm bây giờ. Liệu có thể làm thay đổi tương lai?

02

Rủi ro liên quan tới sự thay đổi, ví dụ như thay đổi về cách nghĩ, về quan điểm, về hoạt động, hoặc về vị trí...

03

Rủi ro liên quan tới sự lựa chọn, và sự không chắc chắn về thứ tự lựa chọn đó.

04

Rủi ro gây ra tổn thất

Tính chất của rủi ro

01

Rủi ro là không thể tránh hoàn toàn, mọi dự án đều tiềm ẩn rủi ro

02

Một số giai đoạn chắc chắn sẽ không theo kế hoạch, do yếu tố khách quan


03

Rủi ro khó có thể loại trừ triệt để, chỉ có thể dự đoán, kiểm soát và giảm thiểu.

04

Rủi ro có thể xảy ra bất ngờ, hoặc tích lũy dần theo thời gian

3. VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ RỦI RO

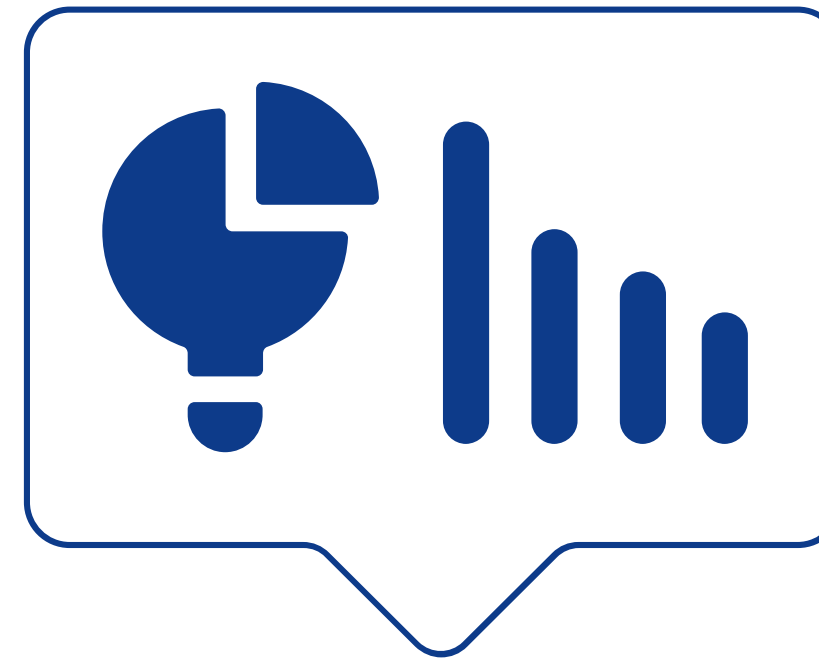

Vai trò của quản lý rủi ro

01

Giảm thiểu tổn thất do các sự kiện ngoài ý muốn gây ra

04

Hỗ trợ lập kế hoạch dự phòng về thời gian, chi phí và nhân lực

02

Tăng cường ý thức kiểm soát dự án

05


Giúp tập trung kiểm soát các công việc trọng yếu

03

Giúp nhận diện sớm và phòng ngừa rủi ro

06

Góp phần bảo đảm tiến độ, chi phí và chất lượng dự án

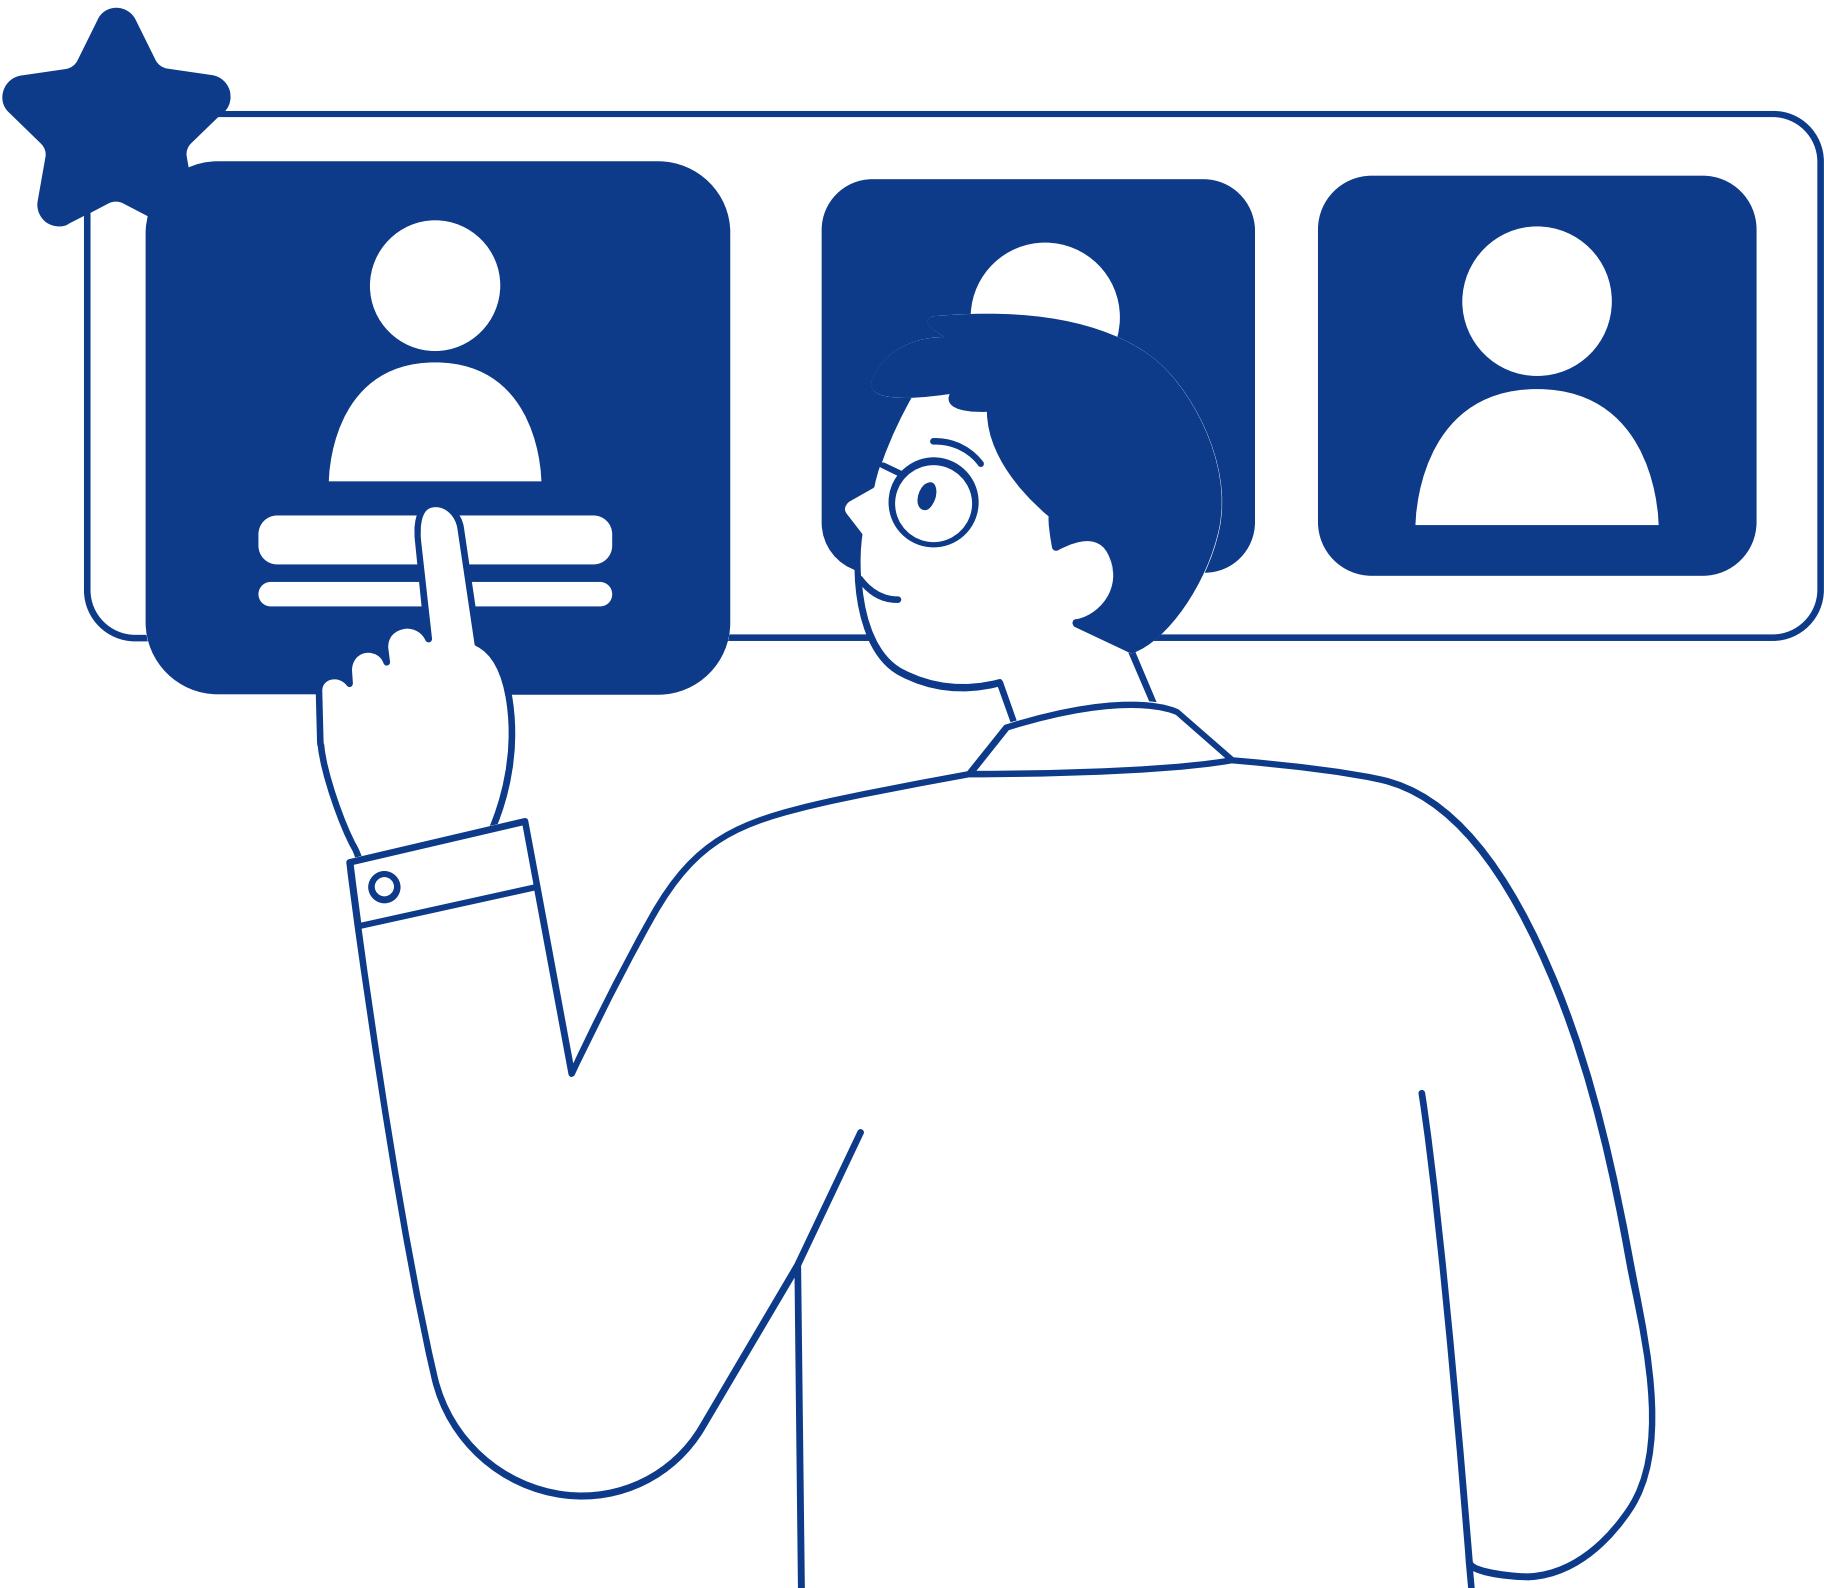

4. CÁC CÔNG VIỆC VÀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

Các công việc quản lý rủi ro

01

Tập trung kiểm soát những công việc hệ trọng, có ảnh hưởng lớn đến thành công của dự án

02

Sửa đổi các ước lượng thời gian và chi phí


03

Đề xuất kế hoạch và kinh phí dự phòng

04

Phối hợp nhân sự có liên quan vào việc hạn chế rủi ro

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

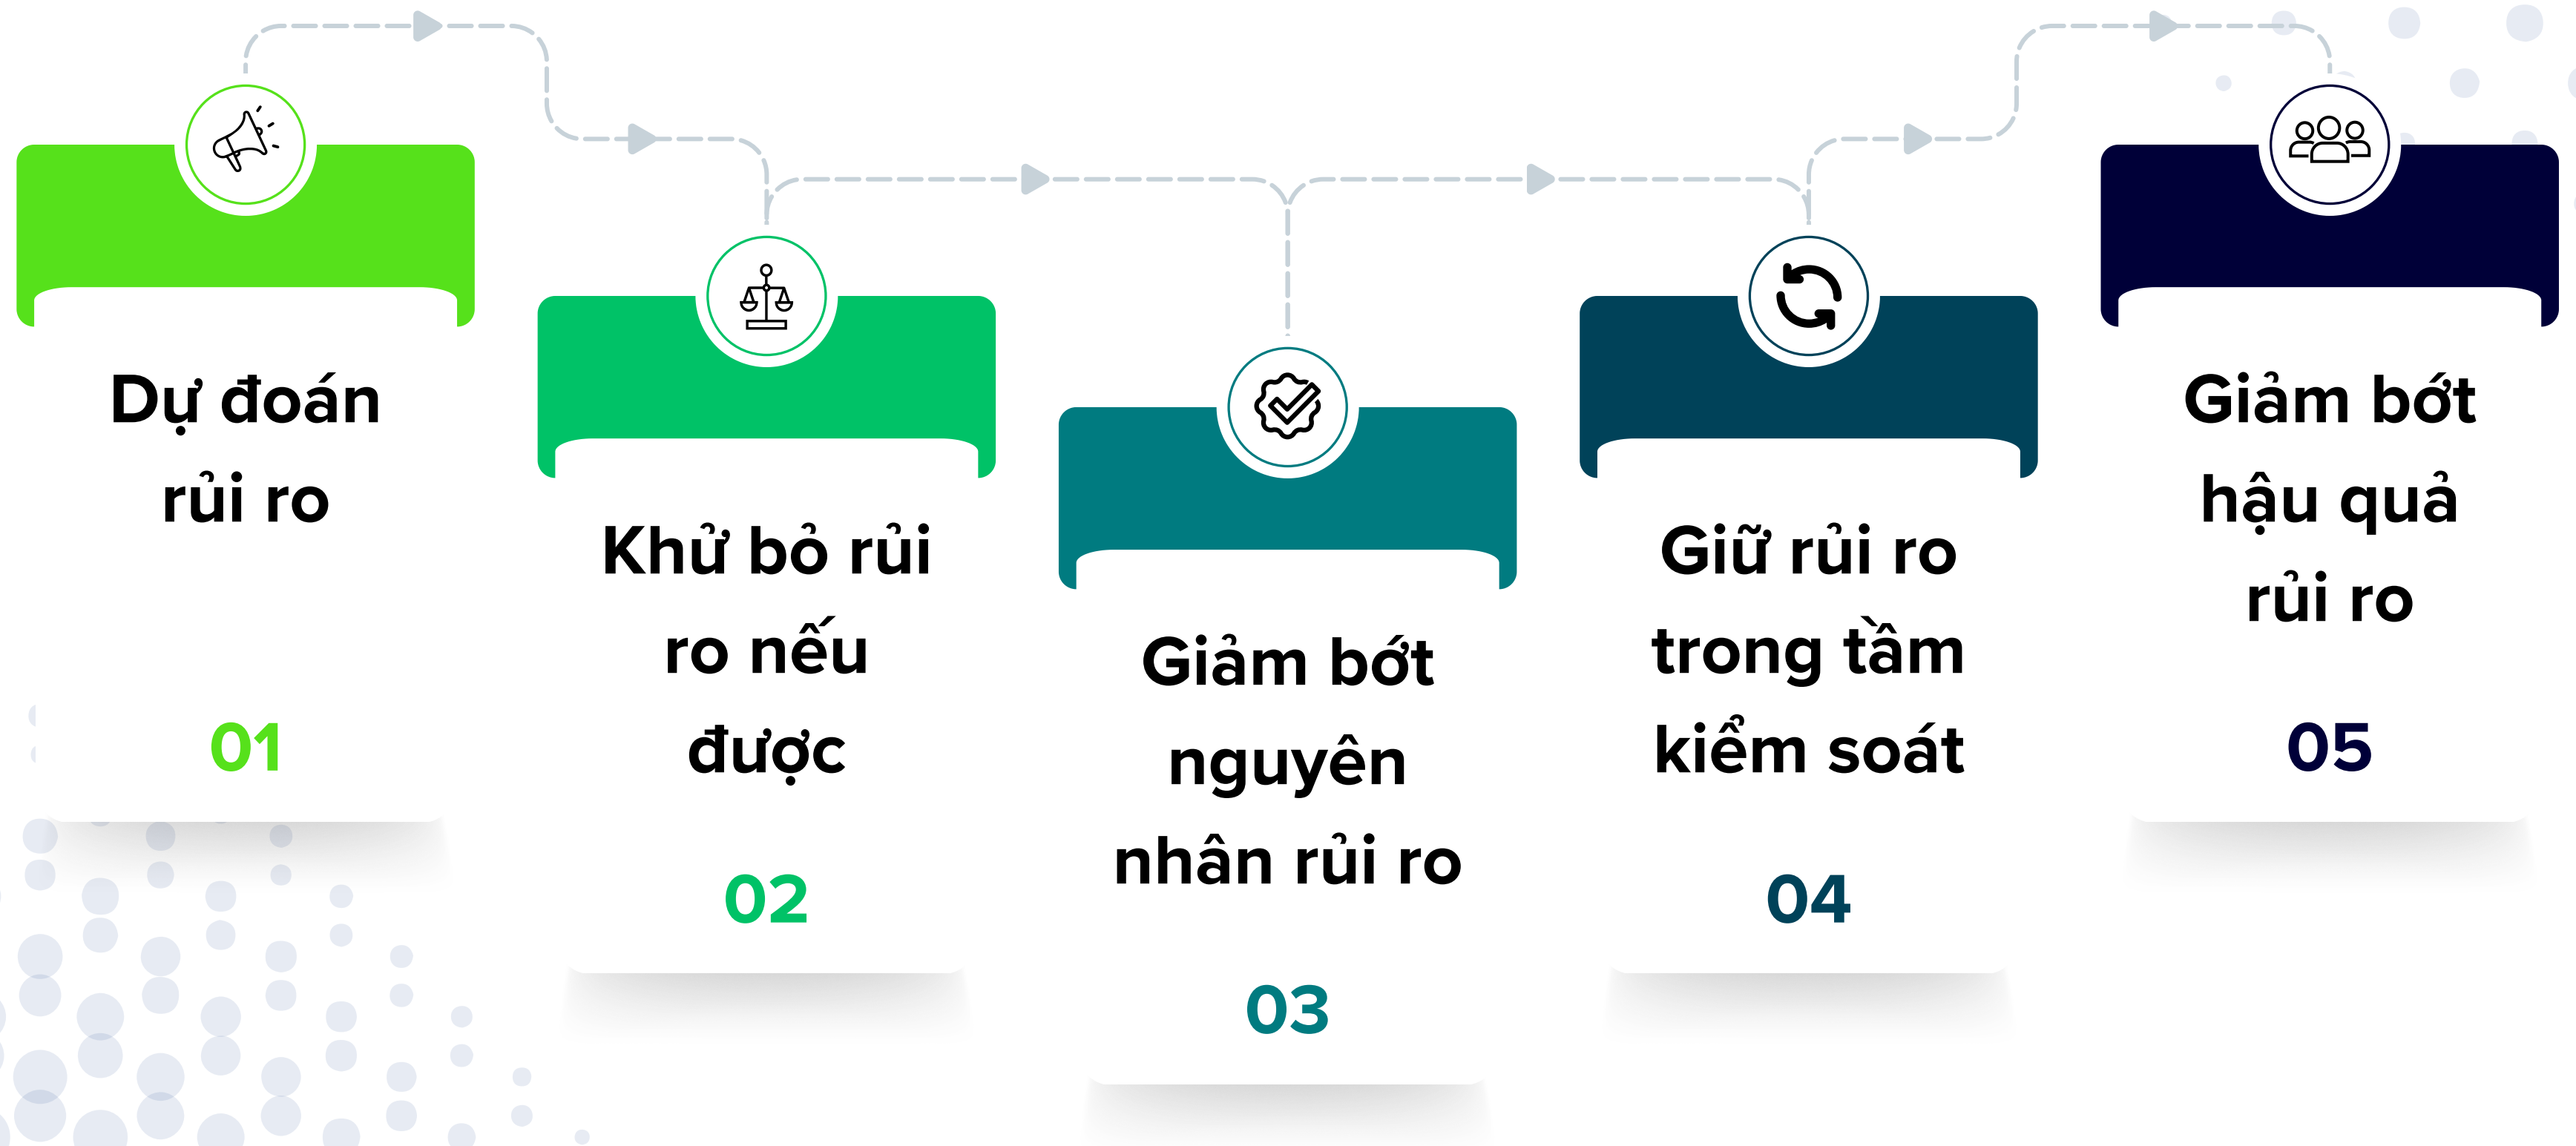

Bước 1: Dự đoán rủi ro

- Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quản lý rủi ro
- Mục đích: Nhận biết sớm các vấn đề có thể xảy ra
- Phương pháp tốt nhất: dựa vào lịch sử các dự án trước đó



DỰ ĐOÁN RỦI RO

RỦI RO CÓ THỂ DỰ ĐOÁN

- Nhân sự nghỉ việc
- Giá thuê văn phòng tăng
- Thiết bị về trễ so với dự kiến

RỦI RO KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN

- Hoả hoạn
- Nhân viên đột tử
- Khủng bố...

Các nguồn phát sinh rủi ro

- Quy mô sản phẩm
- Ảnh hưởng của thị trường
- Đặc tính của khách hàng
- Xác định quy trình
- Môi trường phát triển
- Công nghệ để xây dựng phần mềm
- Quy mô và kinh nghiệm của nhân viên



Các kỹ thuật nhận diện rủi ro

01

Phân tích giả định

Xem xét các giả định và ràng buộc của dự án để phát hiện nguy cơ tiềm ẩn.

02

Đánh giá tài liệu

Rà soát tài liệu dự án để tìm các điểm thiếu rõ ràng, mâu thuẫn hoặc chưa đầy đủ.

03

Thu thập thông tin

Thu thập ý kiến từ nhóm dự án, các bên liên quan và chuyên gia để xây dựng danh sách rủi ro.

04

SWOT Analysis

Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để phát hiện các rủi ro tiềm ẩn.

05

Phân tích danh sách kiểm tra

Sử dụng danh sách kiểm tra từ các dự án trước để xác định những rủi ro tương tự có thể xảy ra trong dự án hiện tại.

Xác định rủi ro cần ưu tiên xử lý

Bảng rủi ro

STT	Nội dung rủi ro	Xác suất (1-10)	Tác động (1-10)	Ưu tiên (X*T)	Thứ tự ưu tiên
1	Yêu cầu dự án thay đổi liên tục	7	8	56	1
2	Thiếu nguồn lực thực hiện	4	7	28	3
3	Chậm tiến độ do phụ thuộc bên thứ ba	5	6	30	2

Bước 2: Khử bỏ rủi ro nếu được

➤ Đây là quá trình tìm kiếm, đánh giá và triển khai các biện pháp để loại bỏ rủi ro một cách hoàn toàn





Thay đổi nhân sự

01

Đào tạo

02

**Cải thiện công cụ
kĩ thuật**

03

**Loại bỏ nguyên
nhân rủi ro**

04

**Thiết lập quyền
kiểm soát**

05

BƯỚC 3: GIẢM BỐT NGUYÊN NHÂN RỦI RO

01

Xác định nguyên nhân gốc rễ của rủi ro

02

Thiết kế và áp dụng các biện pháp phòng ngừa cụ thể

03

Theo dõi và điều chỉnh quy trình làm việc

04

Đào tạo và phát triển nhân viên

05

Tăng cường công cụ và tài nguyên hỗ trợ phòng ngừa



06

Học hỏi từ kinh nghiệm

BƯỚC 3: GIẢM BỐT NGUYÊN NHÂN RỦI RO

1. Xác định nguyên nhân gốc rễ của rủi ro

The 5 Whys

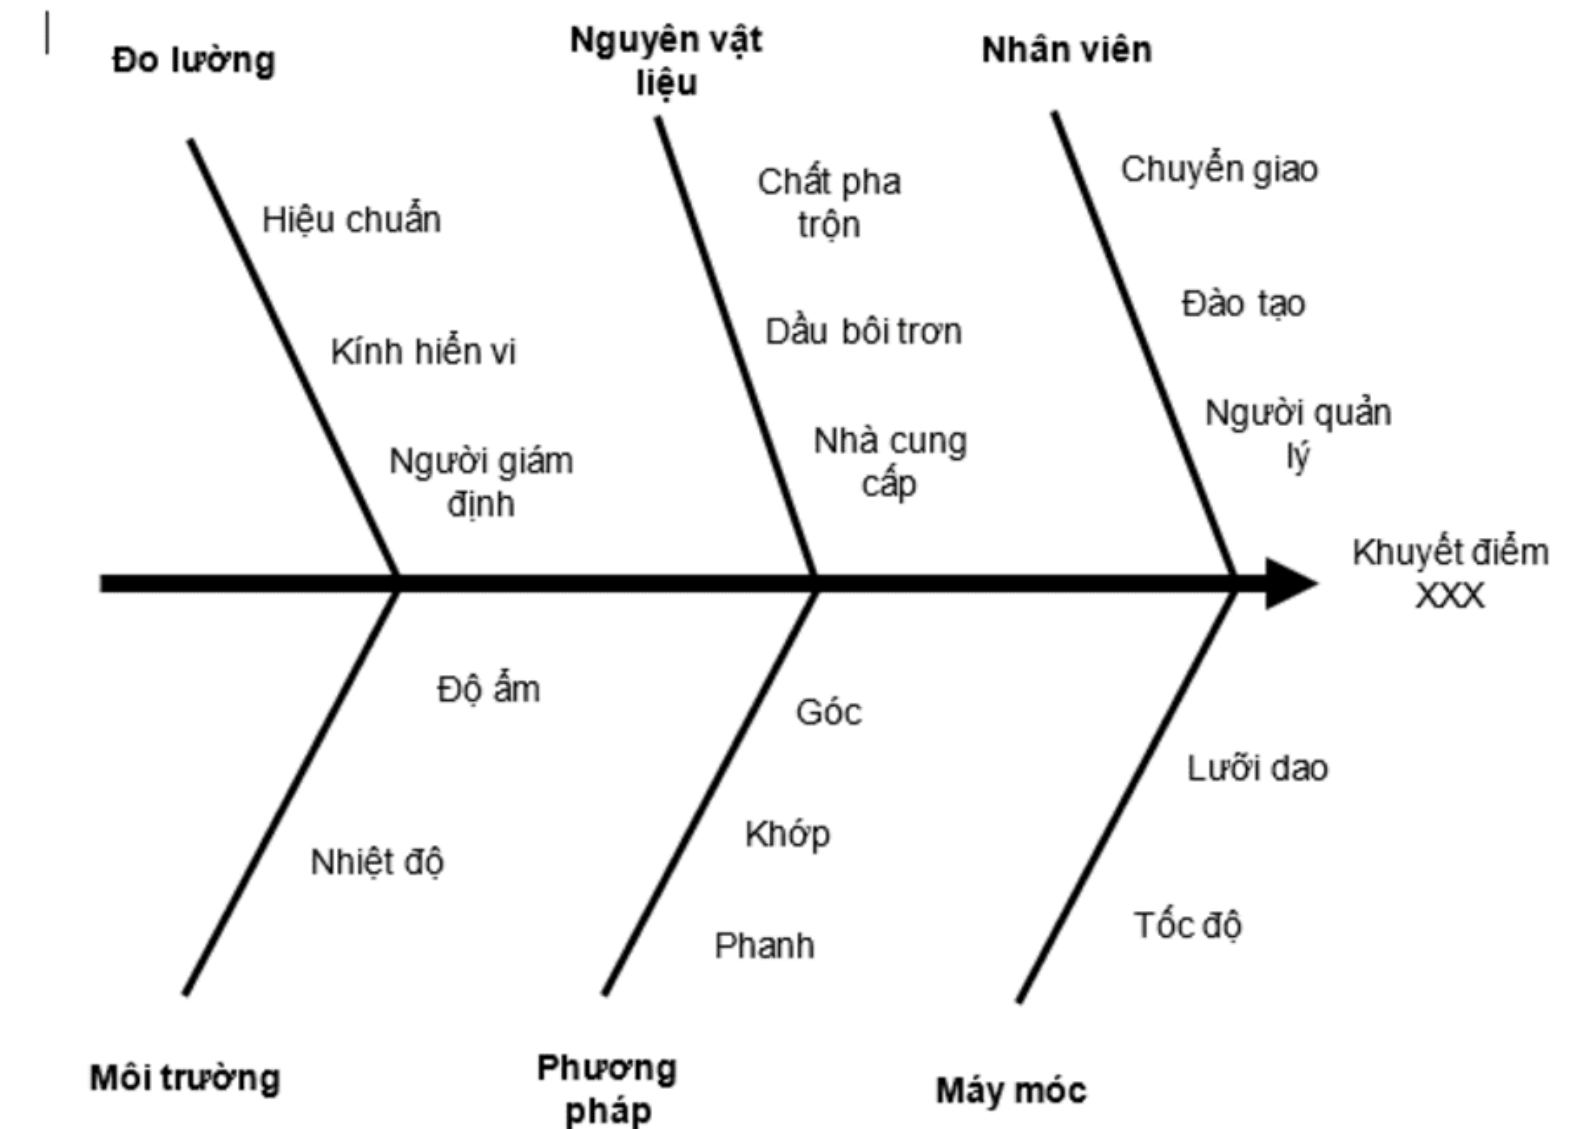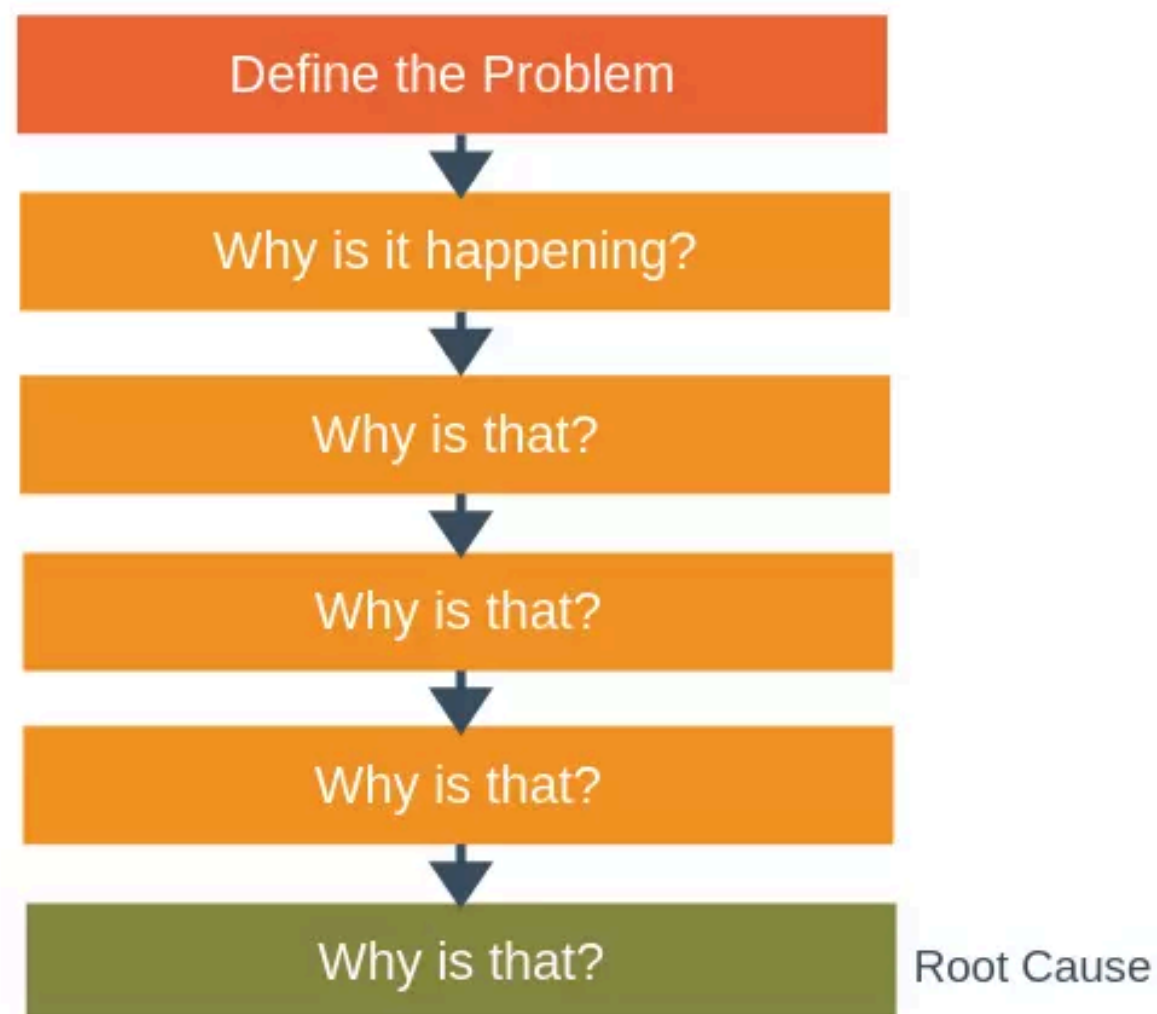

BƯỚC 3: GIẢM BỚT NGUYÊN NHÂN RỦI RO

2. Thiết kế và áp dụng các biện pháp phòng ngừa cụ thể



- Thiết kế biện pháp phòng ngừa theo từng nguyên nhân
- Phân công trách nhiệm cụ thể
- Theo dõi mức độ hiệu quả của từng biện pháp để điều chỉnh kịp thời

BƯỚC 3: GIẢM BỚT NGUYÊN NHÂN RỦI RO

3.Theo dõi và điều chỉnh quy trình làm việc



- Tối ưu quy trình bằng cách loại bỏ thao tác thừa và bổ sung bước kiểm soát
- Rà soát các bước thực hiện để phát hiện điểm dễ xảy ra lỗi

BƯỚC 3: GIẢM BỚT NGUYÊN NHÂN RỦI RO

4. Đào tạo và phát triển nhân viên



- Tất cả thành viên trong dự án cần được đào tạo đầy đủ để thực hiện công việc chính xác và hiệu quả.
- Tổ chức đào tạo định kỳ hoặc theo nhu cầu về an toàn, kỹ thuật và quản lý rủi ro
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn chi tiết để nhân viên dễ tra cứu và áp dụng

BƯỚC 3: GIẢM BỐT NGUYÊN NHÂN RỦI RO

5. Tăng cường công cụ và tài nguyên hỗ trợ phòng ngừa



- Trang bị công cụ giám sát và cảnh báo sớm rủi ro.
- Đảm bảo đầy đủ nguồn lực cần thiết để ứng phó kịp thời

BƯỚC 3: GIẢM BỐT NGUYÊN NHÂN RỦI RO

6. Học hỏi từ kinh nghiệm



- Rút kinh nghiệm từ các dự án trước để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro
- Phân tích cả thành công và thất bại để cải thiện kế hoạch cho các dự án sau

BƯỚC 4: GIỮ RỦI RO TRONG TẦM KIỂM SOÁT

Theo dõi thường xuyên các rủi ro đã được xác định

- Xây dựng cơ chế giám sát rủi ro xuyên suốt quá trình thực hiện
- Sử dụng biểu mẫu theo dõi, bảng tổng hợp hoặc công cụ quản lý để cập nhật tình trạng rủi ro
- Giao rõ người phụ trách theo dõi và xử lý từng rủi ro cụ thể



Bước 4: Giữ rủi ro trong tầm kiểm soát

Đo lường hiệu quả của các biện pháp ứng phó

- Đánh giá mức độ hiệu quả của các biện pháp đã triển khai
- Sử dụng KPI, chỉ số chất lượng hoặc phản hồi từ nhóm dự án để theo dõi
- Điều chỉnh kịp thời nếu biện pháp chưa đạt kết quả mong muốn



Bước 4: Giữ rủi ro trong tầm kiểm soát

Cập nhật và phản ứng kịp thời khi rủi ro thay đổi

- Theo dõi sát để phát hiện sớm khi rủi ro xuất hiện hoặc gia tăng
- Thiết lập cơ chế cảnh báo và xử lý nhanh khi có biến động
- Khi phát sinh rủi ro mới, cần quay lại bước nhận diện và phân tích




Bước 5: Giảm bớt hậu quả rủi ro

Giảm bớt hậu quả rủi ro có nghĩa là giảm thiểu hậu quả của rủi ro thông qua việc sử dụng các biện pháp kiểm soát cụ thể

- Né tránh rủi ro: Thay đổi kế hoạch để loại bỏ rủi ro
- Giảm thiểu rủi ro: Giảm xác suất hoặc mức độ ảnh hưởng
- Chuyển giao rủi ro: Chuyển cho bên thứ ba (bảo hiểm, outsource)
- Chấp nhận rủi ro: Chấp nhận và chuẩn bị phương án dự phòng



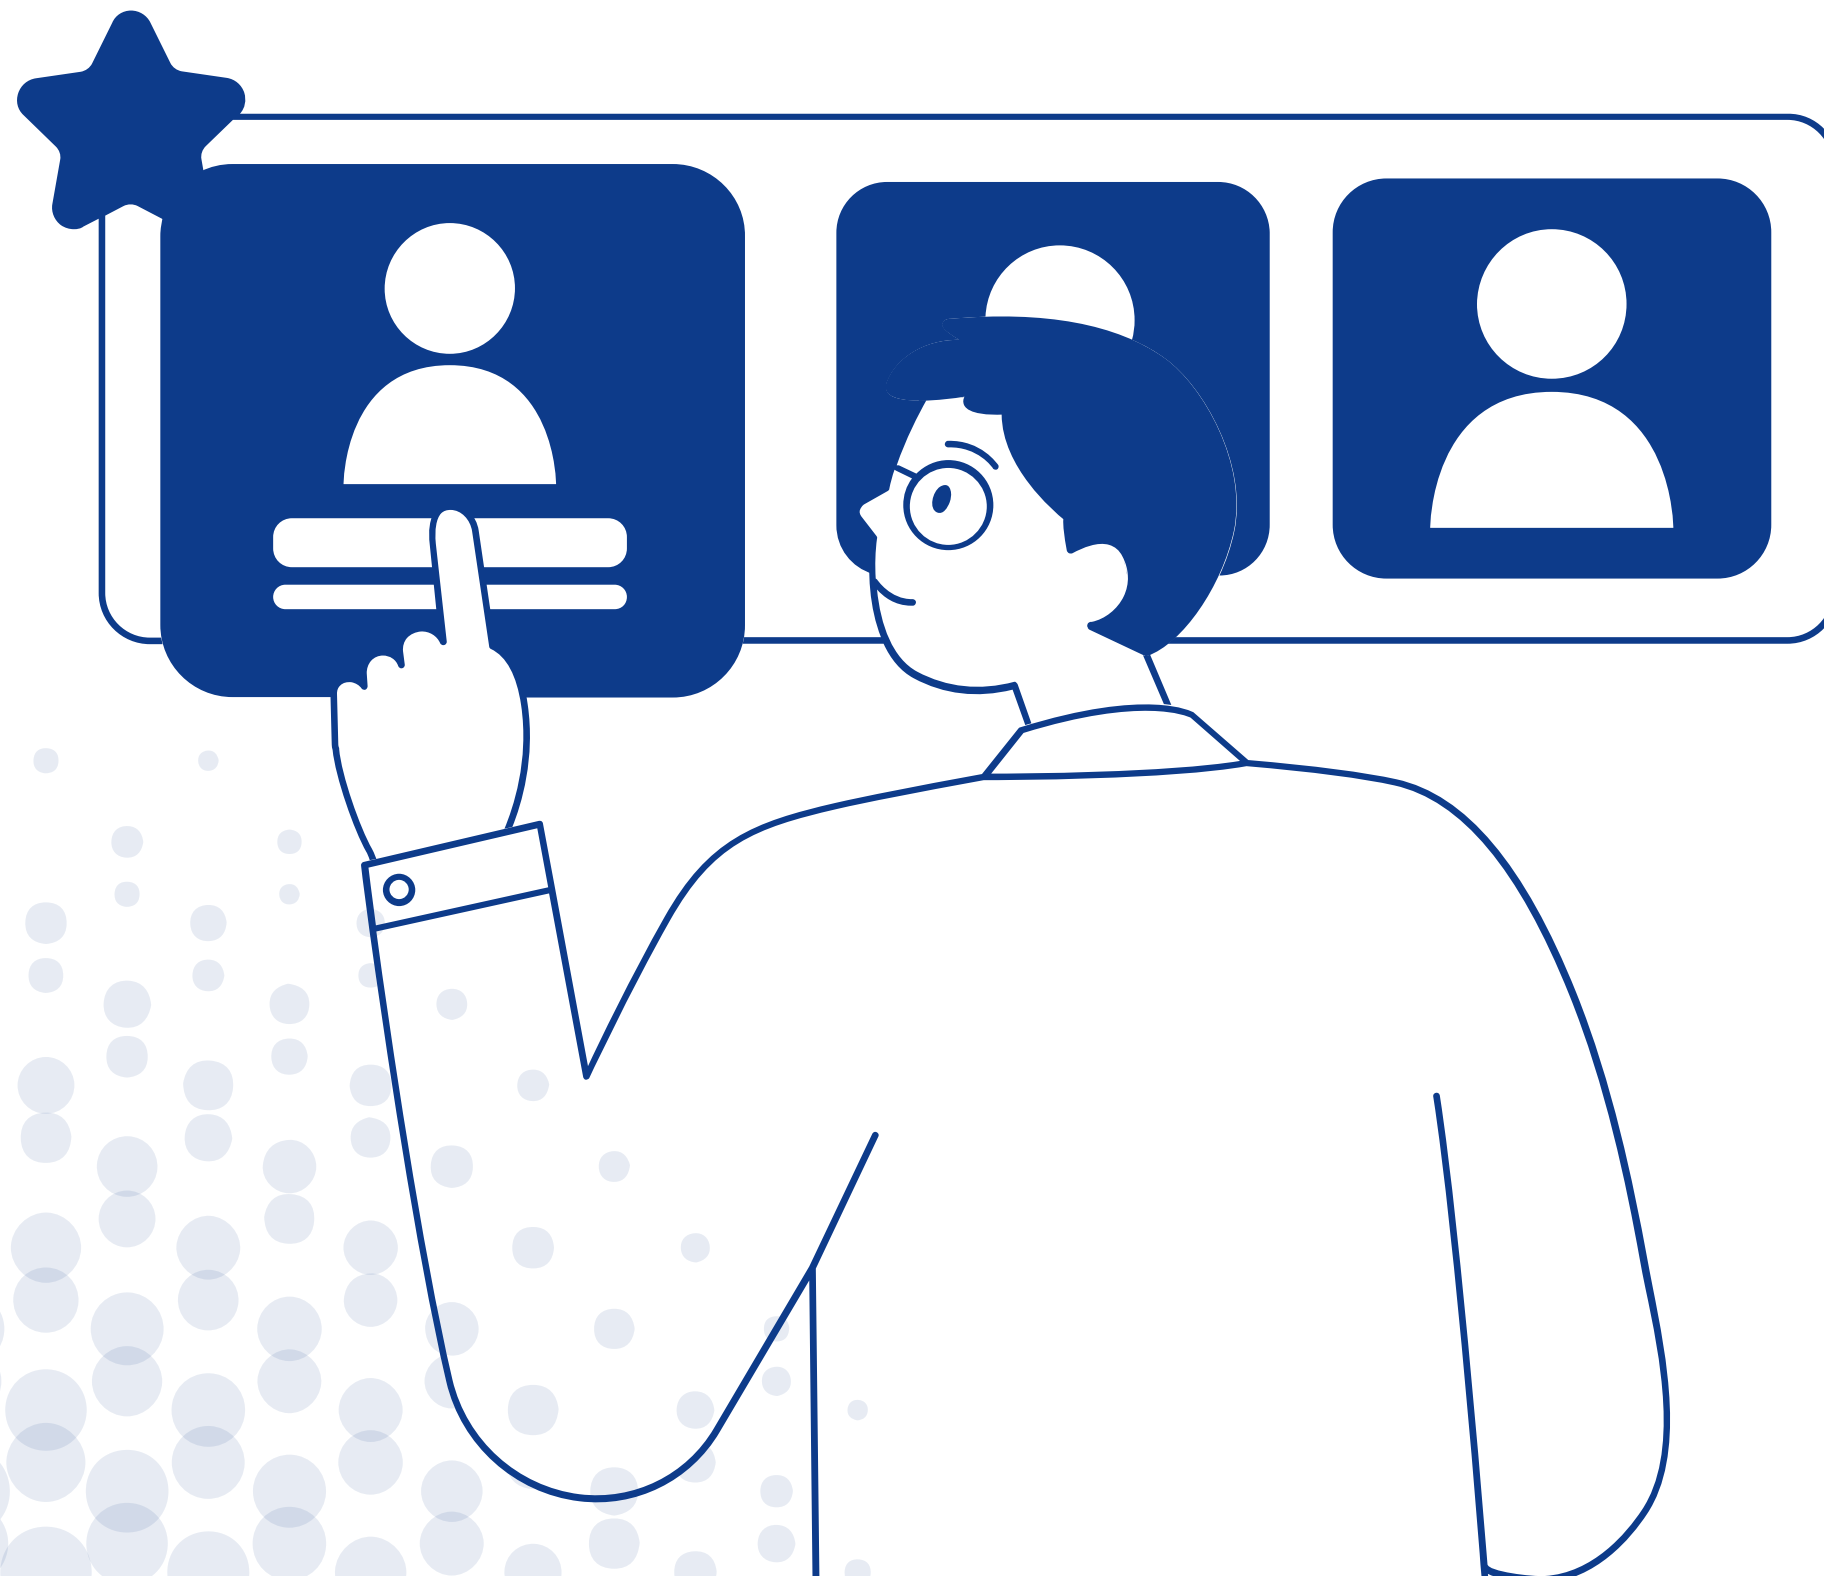

5. CÁC TÌNH HUỐNG RỦI RO THƯỜNG GẶP



VS



PHÂN LOẠI RỦI RO

CÁC YẾU TỐ NỘI TẠI VÀ NGOẠI CẢNH

CHỦ QUAN

- Rủi ro do năng lực và kinh nghiệm
- Rủi ro do giao tiếp và phối hợp
- Rủi ro do thái độ và tâm lý
- Rủi ro từ quản lý và ra quyết định
- Rủi ro đạo đức và trách nhiệm

KHÁCH QUAN

- Rủi ro thiên tai và thời tiết
- Rủi ro pháp lý và quy định
- Rủi ro kinh tế, công nghệ, xã hội và chính trị
- Rủi ro sức khỏe và tính mạng
- Rủi ro về đối tác và nhà cung cấp



BA LOẠI RỦI RO PHỔ BIẾN TRONG DỰ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Tên rủi ro	Nguyên nhân	Hậu quả
Rủi ro dự án	Dự tính ngân sách, kế hoạch, cá nhân(nhân viên, tổ chức), tài nguyên, khách hàng, và những yêu cầu	Kế hoạch lịch trình sai sẽ làm tăng chi phí
Rủi ro kỹ thuật	Rủi ro kỹ thuật được tìm ra trong thiết kế, cài đặt, giao diện, sự kiểm tra, và vấn đề bảo trì. Thêm vào đó, sự tối nghĩa, kỹ thuật không vững chắc, kỹ thuật lỗi thời, và công nghệ “giới hạn sự hướng dẫn” cũng là tác nhân của rủi ro. Rủi ro kỹ thuật xảy ra vì vấn đề khó giải quyết hơn chúng ta nghĩ nó sẽ xảy ra.	Nếu một lỗi kỹ thuật trở thành hiện thực, sự cài đặt có thể trở lên khó khăn hoặc không thể.
Rủi ro nghiệp vụ	Chiến lược không phù hợp; thiếu hiểu biết về thị trường và nhu cầu khách hàng	Sản phẩm không đáp ứng nhu cầu, dự án có thể thất bại



6. CÔNG CỤ & LƯU Ý TRONG QUẢN LÝ RỦI RO



CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ

a) Bảng phân loại độ rủi ro

Tác động đến dự án				
Khả năng xảy ra		Nhỏ	Vừa	Lớn
	70%-99%	Trung bình	Cao	Không chấp nhận
	40%-69%	Thấp	Cao	Không chấp nhận
	1%-39%	Thấp	Trung bình	Cao



CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ



b) Bảng nhân độ đo

Tác động đến dự án						
Khả năng xảy ra		1	2	3	4	5
	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

$$\text{Risk_score} = P \times I$$

Trong đó:

- **P: Khả năng xảy ra.** Thường được định nghĩa trên thang đo định tính (1-Hiếm khi, 5-Rất thường xuyên)
- **I: Tác động đến dự án.** Mức độ ảnh hưởng/thiệt hại (1-Không đáng kể, 5-Thảm họa)

“Giá trị càng cao → mức độ rủi ro càng lớn”

CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ

C) BẢNG QUẢN LÝ RỦI RO

Khoản mục rủi ro	Độ rủi ro	Phòng ngừa	Khắc phục	Người chịu trách nhiệm	Chi phí thời gian
Hiểu sai yêu cầu	Cao	Làm prototype, lấy chữ ký khách hàng	Thảo luận lại với khách hàng	PM	8 giờ
Server hư	Cao	Quản lý truy cập server, lên lịch bảo trì	Chuyển sang server backup	IT	3 giờ
Mất dữ liệu	Cao	Quản lý truy cập dữ liệu, tạo firewall	Restore dữ liệu backup	IT	2 giờ
Lập trình viên bỏ việc	Trung bình	Tạo không khí làm việc tích cực	Cử lập trình viên backup	TL	1 giờ

LƯU Ý TRONG QUẢN LÝ RỦI RO

- Kiểm soát rủi ro là nhằm giảm thiểu thiệt hại, không có dự án nào hoàn toàn tránh được rủi ro
- Công bố rủi ro và nguyên nhân nếu cần
- Việc dự báo rủi ro phụ thuộc kinh nghiệm người quản lý dự án
- Những thiệt hại về chất lượng, thời gian và tiền bạc mà rủi ro gây ra cho dự án phải được lưu thành tài liệu



7. THÀNH QUẢ VÀ TỔNG KẾT



TỔNG KẾT



THÀNH QUẢ CỦA QUẢN LÝ TỐT RỦI RO DỰ ÁN

- Dự án diễn ra suôn sẻ, đúng tiến độ, trong ngân sách
- Ít khủng hoảng bất ngờ – nhờ đã có kế hoạch dự phòng
- Giảm thiểu tổn thất về thời gian, chi phí, chất lượng
- Tăng cường sự tin tưởng từ khách hàng và nhà tài trợ
- Nâng cao năng lực dự báo và kiểm soát cho đội dự án

TỔNG KẾT



BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN QUẢN LÝ RỦI RO

- Dự đoán rủi ro là bước quan trọng nhất
- Không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro
- Ghi chép và công bố rủi ro giúp tổ chức học hỏi và cải thiện
- Phân công trách nhiệm rõ ràng trong từng tình huống rủi ro
- Dự án càng lớn rủi ro càng nhiều
- Giữ bình tĩnh và kiểm soát rủi ro xảy ra


**“ĐỪNG QUÁ SAY MÊ CÔNG NGHỆ MỚI
MÀ QUÊN ĐI YÊU CẦU CỐT LÕI”**

THÔNG DIỆP

**“Dự án suôn sẻ không có
nghĩa là không có rủi ro
mà là rủi ro đã được
kiểm soát tốt.”**



BÀI TẬP QUẢN LÝ RỦI RO TRONG DỰ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

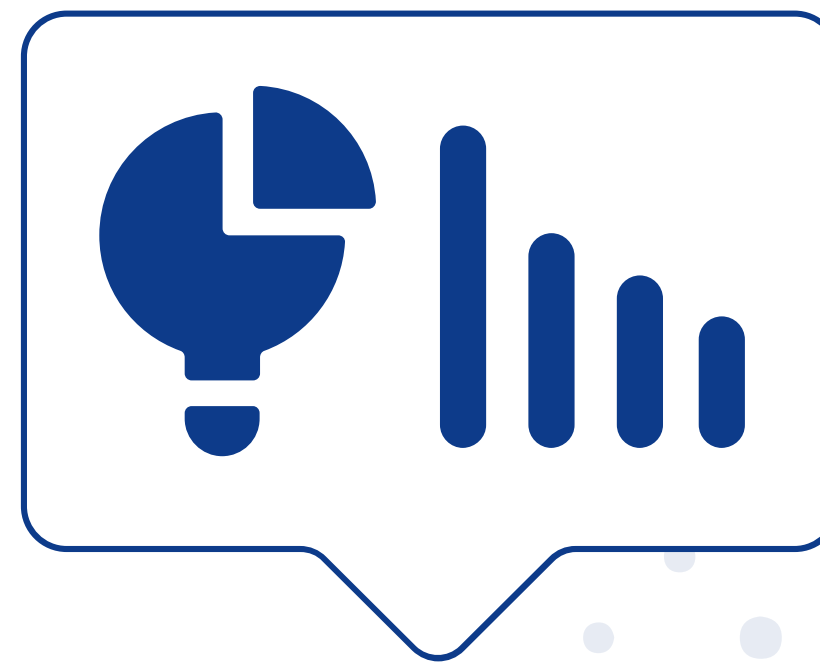

B1: DỰ ĐOÁN RỦI RO CỦA DỰ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

- Thiếu nhân lực chuyên môn
- Rủi ro về yêu cầu (yêu cầu không rõ ràng, thay đổi liên tục, không thể thực hiện,...)
- Chậm tiến độ
- Giao tiếp nhóm kém hiệu quả
- Sự cố kỹ thuật
- Rủi ro bảo mật
- Vượt ngân sách

PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN (1-10)

Rủi ro	Rất cao - Cao (10 - 8)	Hay xảy ra (7 - 5)	Đôi khi (4 - 2)	Hiếm khi (1)
Thiếu nhân lực chuyên môn				
Rủi ro về yêu cầu				
Chậm tiến độ				
Giao tiếp nhóm kém hiệu quả				
Sự cố kỹ thuật				
Rủi ro bảo mật				
Vượt ngân sách				

PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN (1-10)

Rủi ro	Rất cao - Cao (10 - 8)	Hay xảy ra (7 - 5)	Đôi khi (4 - 2)	Hiếm khi (1)
Thiếu nhân lực chuyên môn		6		
Rủi ro về yêu cầu		6		
Chậm tiến độ	8			
Giao tiếp nhóm kém hiệu quả		5		
Sự cố kỹ thuật			4	
Rủi ro bảo mật			2	
Vượt ngân sách				1

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO (1-10)

Rủi ro	Trầm trọng (10 - 8)	Lớn (7 - 5)	Vừa phải (4 - 2)	Không đáng kể (1)
Thiếu nhân lực chuyên môn		7		
Rủi ro về yêu cầu		7		
Chậm tiến độ	9			
Giao tiếp nhóm kém hiệu quả			3	
Sự cố kỹ thuật			4	
Rủi ro bảo mật	10			
Vượt ngân sách		7		

TÍNH TOÁN ĐIỂM RỦI RO

Tính toán Điểm rủi ro (Risk Score) theo công thức:

RiskScore = Khả năng xuất hiện x Mức độ tác động

Rủi ro	Điểm rủi ro	Thứ tự ưu tiên
Thiếu nhân lực chuyên môn	42	2
Rủi ro về yêu cầu	42	2
Chậm tiến độ	72	1
Giao tiếp nhóm kém hiệu quả	15	5
Sự cố kỹ thuật	16	4
Rủi ro bảo mật	20	3
Vượt ngân sách	7	6

B2: KHỬ BỎ RỦI RO NẾU CÓ THỂ

Rủi ro	Khử bỏ rủi ro
Thiếu nhân lực chuyên môn	Không thể
Rủi ro về yêu cầu	Không thể
Chậm tiến độ	Không thể
Giao tiếp nhóm kém hiệu quả	Có thể, khử bỏ bằng cách áp dụng quy trình bắt buộc: Mọi thông tin phải qua văn bản/Jira.
Sự cố kỹ thuật	Không thể
Rủi ro bảo mật	Không thể
Vượt ngân sách	Có thể, áp dụng "Design to Cost": Chỉ làm trong đúng số tiền có sẵn, nếu hết tiền thì cắt tính năng, nhất quyết không chi thêm.

B3 - 4: GIẢM BỐT NGUYÊN NHÂN, GIỮ RỦI RO TRONG TẦM KIỂM SOÁT

Rủi ro	Phương pháp
Thiếu nhân lực chuyên môn	Có tài liệu và quy trình đào tạo nguồn nhân lực phù hợp
Rủi ro về yêu cầu	Làm mẫu (prototype) gửi bản thảo cho khách hàng, ký hợp đồng, xác nhận của khách hàng về yêu cầu.
Chậm tiến độ	Chia nhỏ thành các giai đoạn dự án, áp dụng mô hình Agile/Scrum, có thời gian dự phòng cho các task khó
Sự cố kỹ thuật	Có quy trình kiểm thử chặt chẽ, sử dụng hạ tầng có khả năng sao lưu dữ liệu tự động và phục hồi nhanh
Rủi ro bảo mật	Kiểm tra định kỳ bằng các công cụ, áp dụng nguyên tắc “Quyền hạn tối thiểu” đối với nhân viên, mã hoá thông tin nhạy cảm.


B5: GIẢM BỐT HẬU QUẢ CỦA RỦI RO

Rủi ro	Phương pháp phòng ngừa	Phương pháp khắc phục
Thiếu nhân lực chuyên môn	Đào tạo bài bản; Viết tài liệu dự án kỹ lưỡng để dễ bàn giao.	Tuyển thêm Outsource ngắn hạn; Ưu tiên nhân sự cho các module quan trọng nhất
Rủi ro về yêu cầu	Làm Prototype/Mockup cho khách hàng xem trước; Ký biên bản xác nhận yêu cầu (Sign-off).	Đàm phán lại về thời gian và chi phí; Điều chỉnh lại phạm vi dự án.
Chậm tiến độ	Lập kế hoạch có thời gian dự phòng; Theo dõi tiến độ hàng ngày.	Làm thêm giờ; Cắt các tính năng chưa quan trọng để ưu tiên phần cốt lõi.
Giao tiếp nhóm kém hiệu quả	Quy định kênh liên lạc chính thức (Slack/Jira); Xây dựng văn hóa chia sẻ thông tin công khai.	Tổ chức họp khẩn để giải quyết mâu thuẫn; Làm rõ lại vai trò và trách nhiệm của từng thành viên.

B5: GIẢM BỐT HẬU QUẢ CỦA RỦI RO

Rủi ro	Phương pháp phòng ngừa	Phương pháp khắc phục
Sự cố kỹ thuật	Thiết lập môi trường Staging (thử nghiệm) giống Production; Code Review và Test thường xuyên.	Sử dụng bản sao lưu (Backup) để khôi phục hệ thống; Rollback (quay lại) phiên bản ổn định gần nhất.
Rủi ro bảo mật	Sử dụng các thư viện bảo mật tiêu chuẩn; Quét lỗ hổng định kỳ; Phân quyền người dùng chặt chẽ.	Vá lỗ hổng ngay lập tức; Rà soát hệ thống để đánh giá mức độ rò rỉ; Thông báo cho các bên liên quan.
Vượt ngân sách	Kiểm soát chi phí hàng tuần; Chỉ mua các dịch vụ/linh kiện thực sự cần thiết.	Cắt giảm các chi phí phụ trợ; Đàm phán với nhà cung cấp hoặc khách hàng để xin thêm kinh phí.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

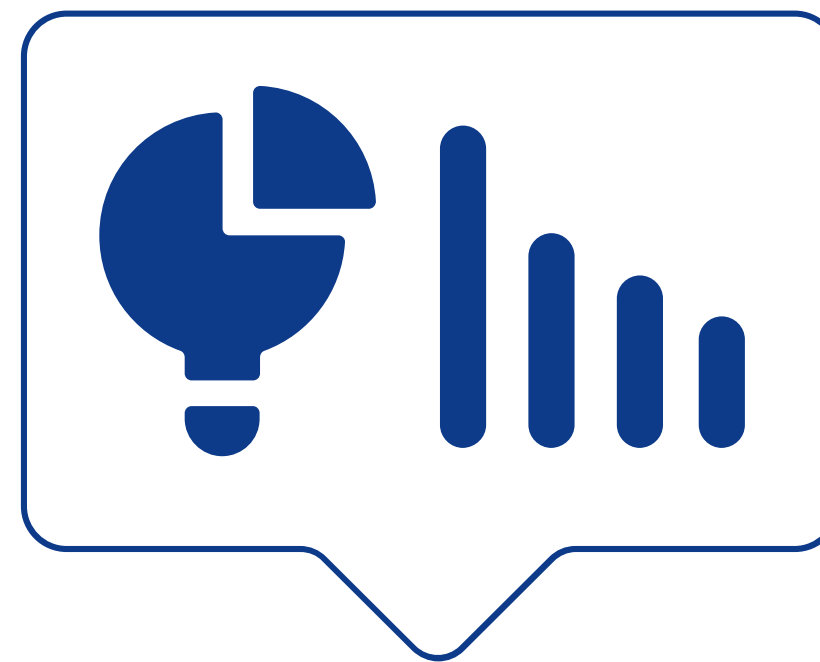

KẾT LUẬN



QUẢN LÝ RỦI RO LÀ MỘT NỘI DUNG KHÔNG THỂ THIẾU TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM. ĐÂY LÀ QUÁ TRÌNH GIÚP DỰ ÁN CHỦ ĐỘNG TRƯỚC NHỮNG BIẾN ĐỘNG, GIẢM THIỂU TỔN THẤT VÀ TĂNG KHẢ NĂNG HOÀN THÀNH ĐÚNG MỤC TIÊU. MỘT DỰ ÁN THÀNH CÔNG KHÔNG PHẢI LÀ DỰ ÁN KHÔNG CÓ RỦI RO, MÀ LÀ DỰ ÁN BIẾT NHẬN DIỆN RỦI RO SỚM, ĐÁNH GIÁ ĐÚNG MỨC ĐỘ VÀ CÓ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ PHÙ HỢP.



DA NANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THANK YOU



