



LIỆT KÊ CÁC CÔNG VIỆC CỦA DỰ ÁN

Nhóm 3:

Đặng Hữu Long 23T-DT3

Nguyễn Trần Công Hữu Đạt 23T-DT3

Nguyễn Quốc Duy 23T-DT3

Trần Tâm Như 23T-DT3





Nội dung

01

Định nghĩa WBS

03

Cấu trúc WBS

05

Nguyên tắc khi xây dựng WBS



02

Tính chất của WBS

04

Các cách tổ chức WBS


06

Cách xây dựng & kiểm tra WBS



01

Định nghĩa WBS

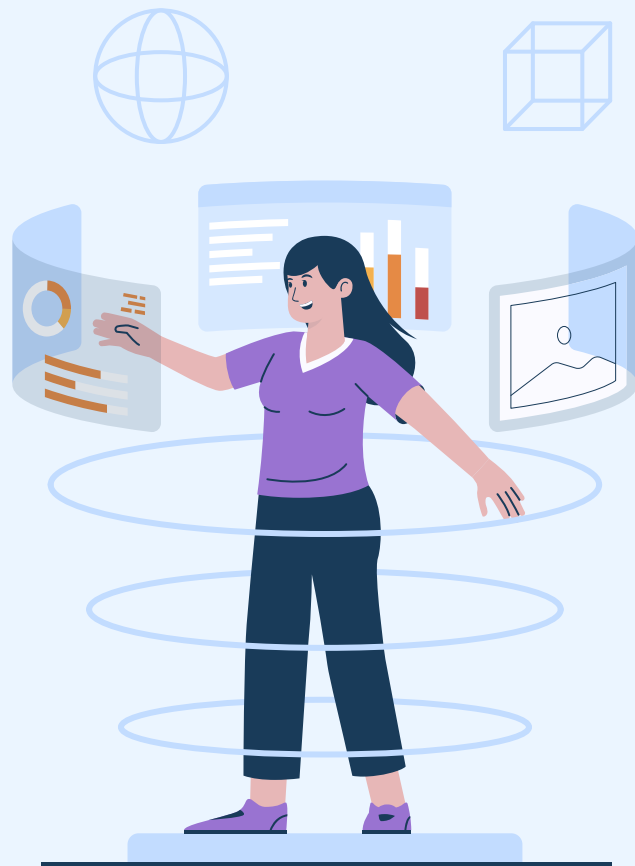



WBS (Work Breakdown Structure): danh sách chi tiết những gì cần làm để hoàn thành dự án


WBS là cơ sở để:

- Lập lịch biểu dự án
- Ước lượng chi phí tổng quát
- Xác định trách nhiệm cá nhân



02

Tính chất của WBS

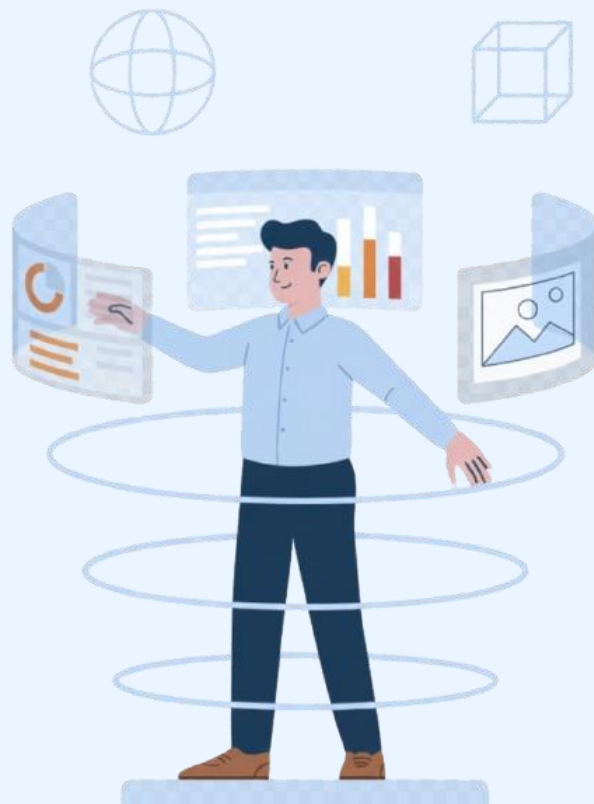



Tính chất của WBS:


- WBS có thể chia nhiều mức (Không phải nhánh nào cũng cần chi tiết như nhau)
- Đi từ sản phẩm cuối rồi chia nhỏ dần

Level 1


Level 2

Level 3


Level 4

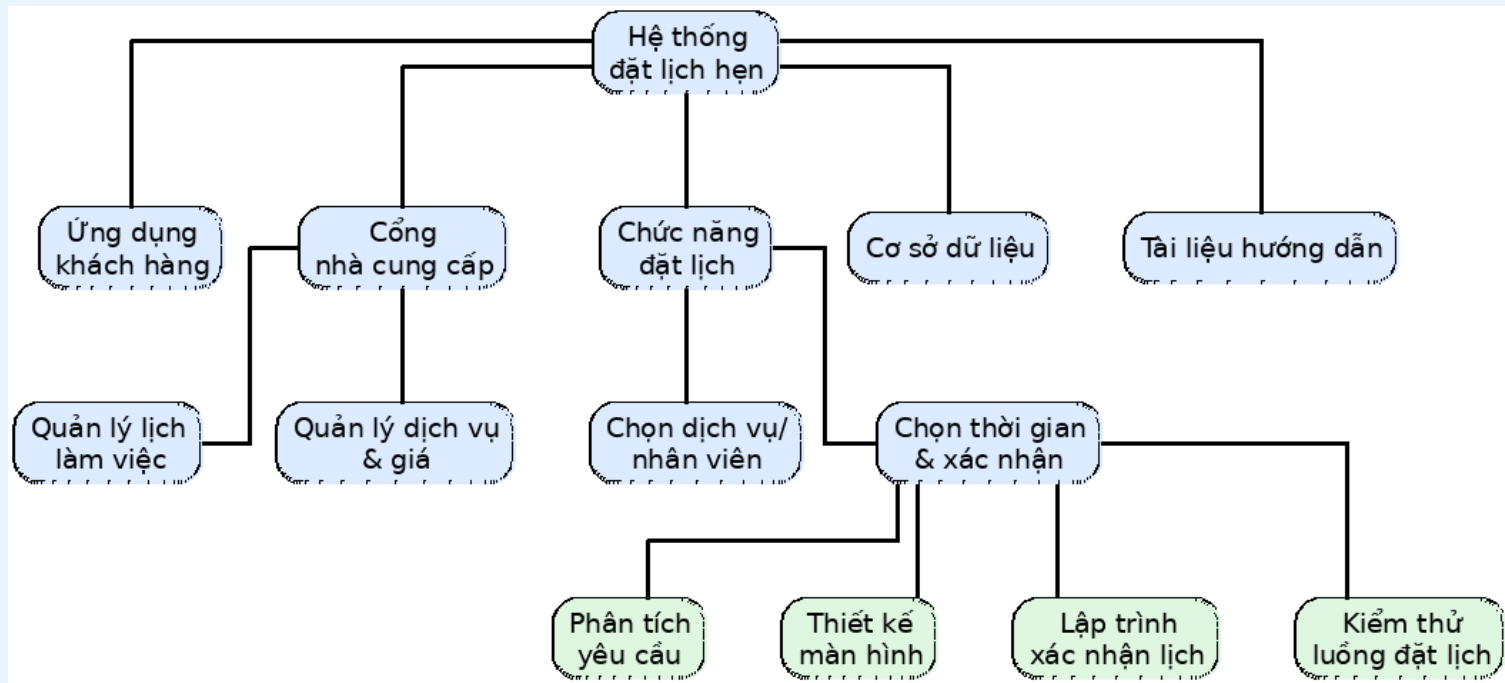

- WBS chỉ mô tả cái gì (what), không mô tả “như thế nào” (how)

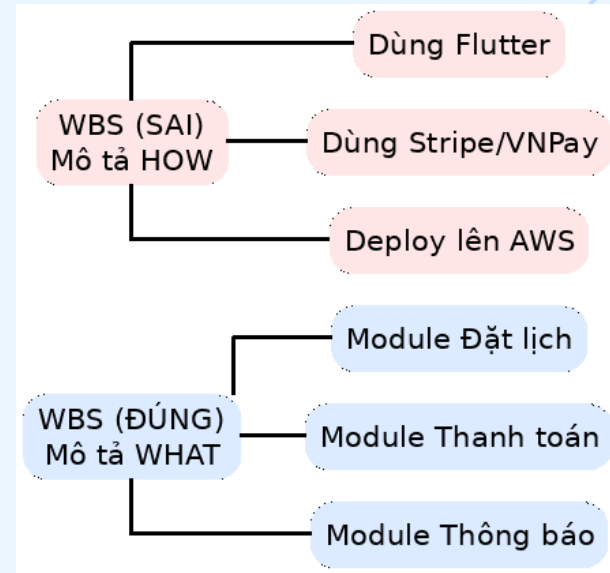


- Trình tự công việc chưa quan trọng (sẽ làm ở bước lập lịch biểu)

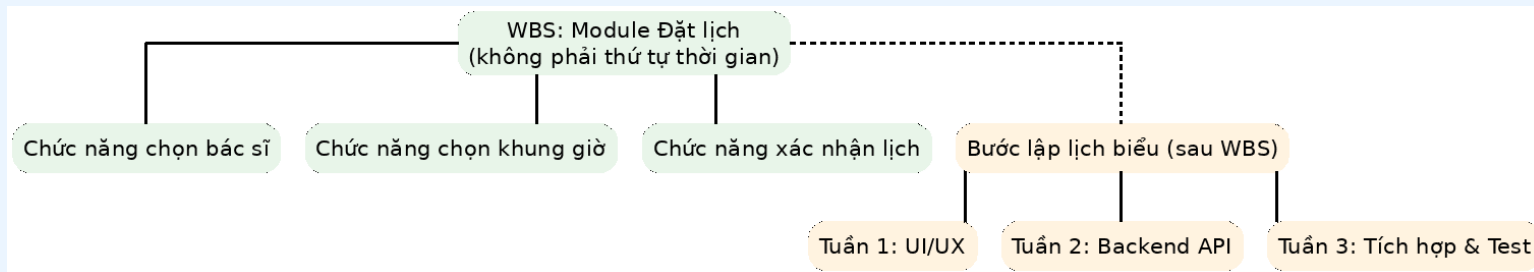

03


Cấu trúc WBS

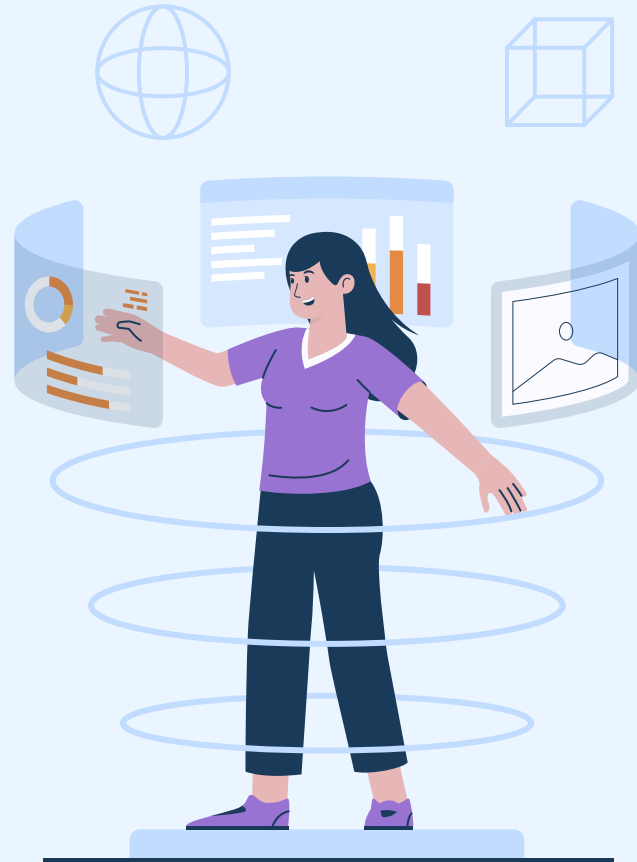




Cấu trúc WBS:

- WBS thường theo hướng từ trên xuống
- Gồm 2 phần chính:
 - PBS (Product Breakdown Structure): mô tả sản phẩm bằng **danh từ**
 - TBS (Task Breakdown Structure): mô tả công việc bằng **động từ + bổ ngữ**

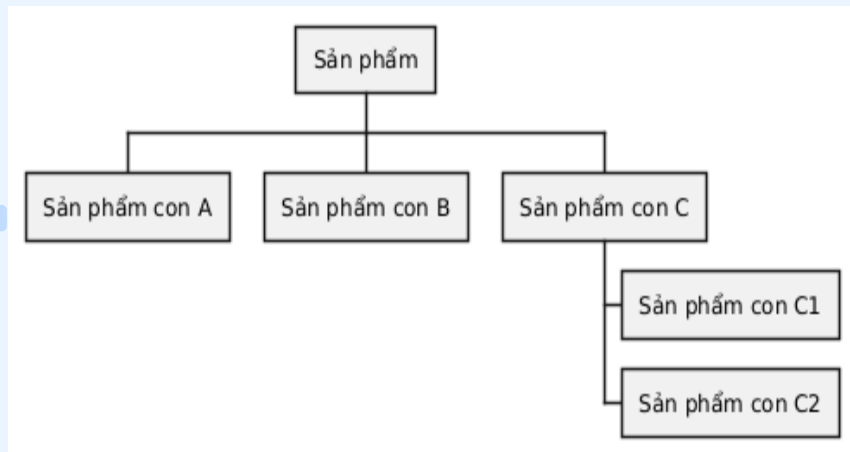


PBS – Product Breakdown Structure

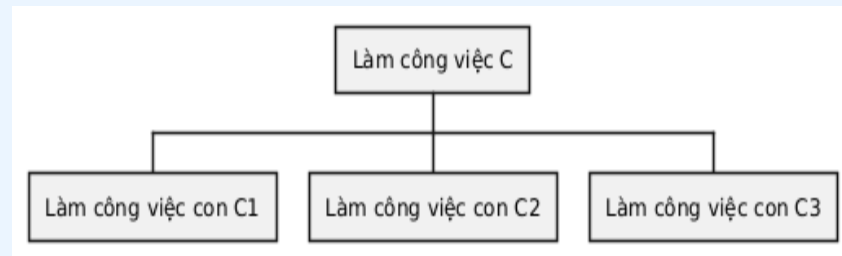


TBS – Task Breakdown Structure



- Kết hợp PBS & TBS:
 - Nửa trên của WBS gồm các mô tả sản phẩm
 - Nửa dưới của WBS gồm các mô tả công việc (để ra được sản phẩm tương ứng)
 - Các phần tử (của PBS và TBS) đều được đánh mã duy nhất

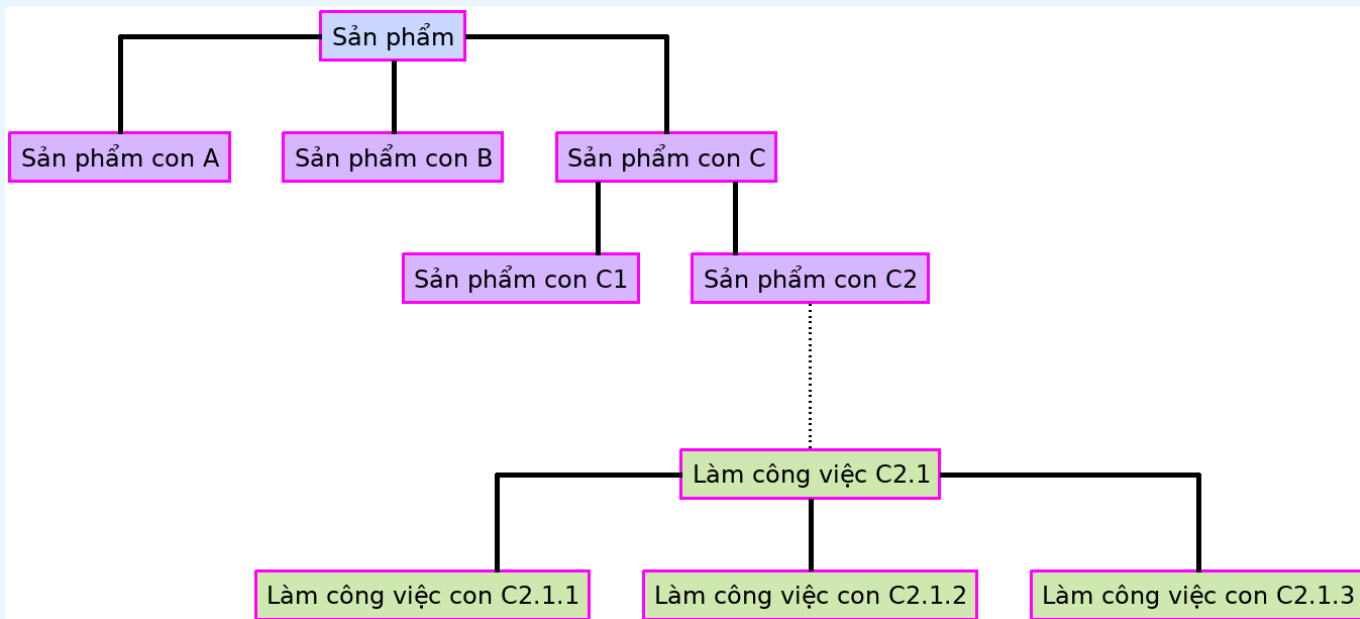

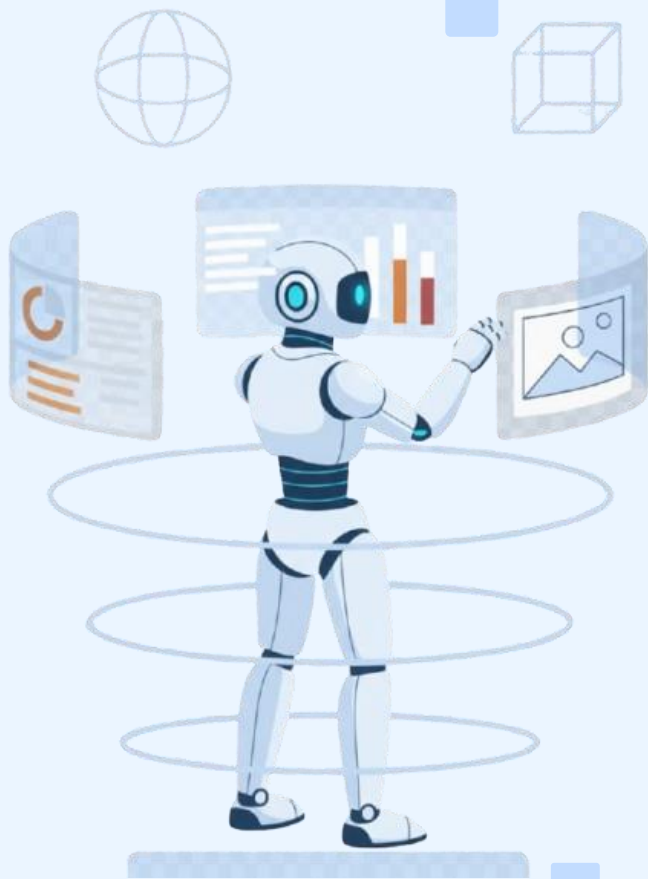

04

Các cách tổ chức WBS



Chia công việc theo sản phẩm chuyển giao

- Level cao: chia theo **deliverable** (sản phẩm/dịch vụ/kết quả).
- Level thấp: phân rã tiếp thành **work package** → **task**.
- Ưu điểm: bám sát “phạm vi & bàn giao”, dễ kiểm soát scope.



Construction of a House

Work	100%
Budget	\$215,500

Level 1

1. Internal

Work	45.60%
Budget	\$86,000

Elements

1.1 Electrical

Electrical Contractor	
Work	11.80%
Budget	\$25,000

1.2 Plumbing

Plumbing Contractor	
Work	33.80%
Budget	\$61,000

2. Foundation

Work	24.00%
Budget	\$46,000

2.1 Excavate

Labor Crew	
Work	18.20%
Budget	\$37,000

2.2 Steel Erection

G.C. Superintendent	
Work	5.8%
Budget	\$9,000

3. External

Work	30.40%
Budget	\$83,500

3.1 Masonry Work

Masonry Contractor	
Work	16.20%
Budget	\$62,000

3.2 Building Finishes

Painting Contractor	
Work	14.20%
Budget	\$21,500

Leg



Chia công việc dựa theo giai đoạn

- Level cao: chia theo **giai đoạn** (thường: khởi tạo – kế hoạch – thực hiện – kiểm soát – đóng gói).
- Mỗi giai đoạn lại phân rã thành work package tương tự.





Construction of a House

1. Design

1.1 Permits

1.2 Drawings

2. Pro-curement

1.1 Electrical

2.2 Plumbing

2.3 HVAC

3. Construction

3.1 Interior

3.2 Exterior

4. Inspections

4.1 Masonry Work

4.2 Building Finishes

5. Turnover


5.1 Walk Thru

5.2 Closing



05

Nguyên tắc khi xây dựng WBS

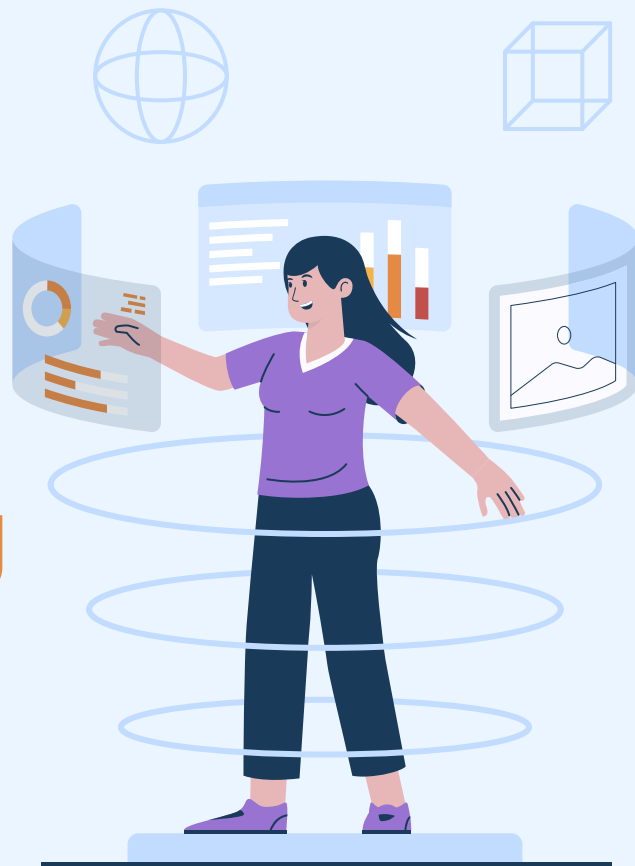

Có 4 nguyên tắc khi xây dựng WBS



Quy tắc 100%:

bao phủ **100% phạm vi** dự án;
tổng các phần tử “con” phải
bằng “mẹ” (ở mọi level).

Mức độ chi tiết phù hợp:


thường dừng ở **3–5 level**; có thể
dùng quy tắc “**2 tuần hoặc 80 giờ**”
để xác định

Tập trung kết quả:

mô tả theo **kết quả cần bàn giao** giúp
rõ phạm vi và linh hoạt cách làm.

Không trùng lặp:

một hạng mục chỉ xuất hiện **một nơi** trong
WBS để tránh chồng chéo trách nhiệm và
sai lệch chi phí.






Quy tắc 8/80 trong WBS:

Cấu trúc phân tích công việc (WBS) được tạo ra đúng cách phải là các phần công việc có thể hoàn thành trong vòng từ 8 đến 80 giờ (đây là quy tắc chung), tùy thuộc vào quy mô của dự án.



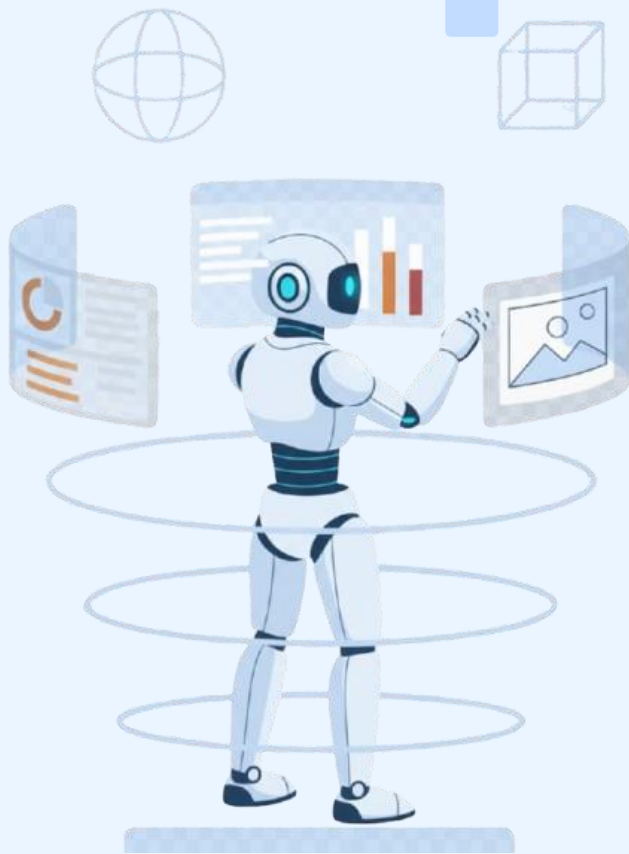


06

Xây dựng & kiểm tra WBS

Các cách trình bày WBS


- Trình bày trên bảng trắng to
- Trình bày trên giấy
- Sử dụng các công cụ / phần mềm như Excel, Wrike, Backlog -> chia sẻ dễ, theo dõi phụ thuộc & cập nhật thay đổi tốt hơn

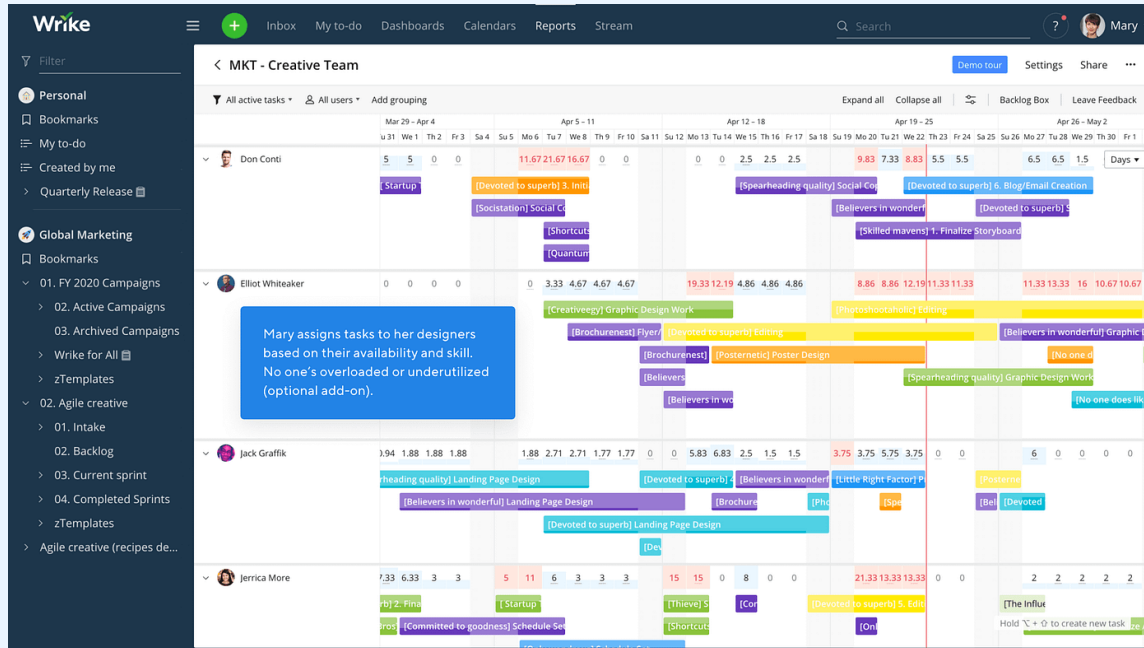



Thông tin để xây dựng WBS

- Tài liệu liên quan tới dự án: phác thảo dự án (SOW), báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi
- Tài liệu không liên quan tới dự án (thông tin phụ trợ): sơ đồ tổ chức cơ quan, các thủ tục hành chính, quy tắc làm việc,...

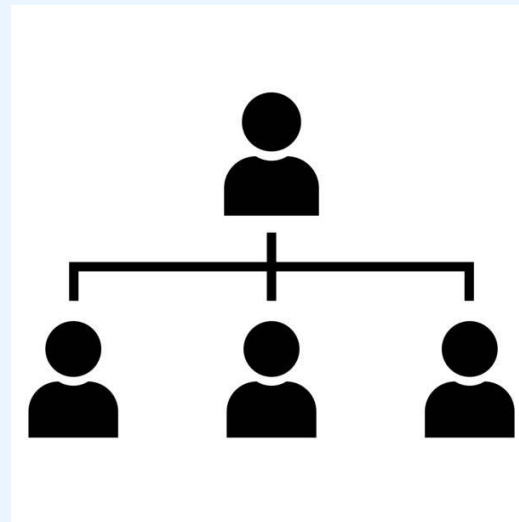



Xác nhận sự đồng thuận


- Chuẩn bị bản thảo của WBS, gửi cho mọi người đọc trước
- Họp thảo luận và lấy chữ ký của những người có liên quan

Bản thảo WBS

Họp thảo luận

Gửi đọc trước


Ký duyệt






Các tiêu chuẩn cho WBS tốt

- Mọi nhánh của WBS được chi tiết tới mức thấp nhất theo quy tắc 80 giờ
- Mọi ô của WBS được đánh mã duy nhất
- Mọi ô của Danh sách sản phẩm được thể hiện bằng danh từ (và tính từ nếu cần)



Các tiêu chuẩn cho WBS tốt (tt)


- Mọi ô của Danh sách công việc được thể hiện bằng động từ và bổ ngữ
- Mọi công việc được xác định đầy đủ trong WBS
- Đã được phản hồi và chấp thuận từ những người liên quan đến WBS

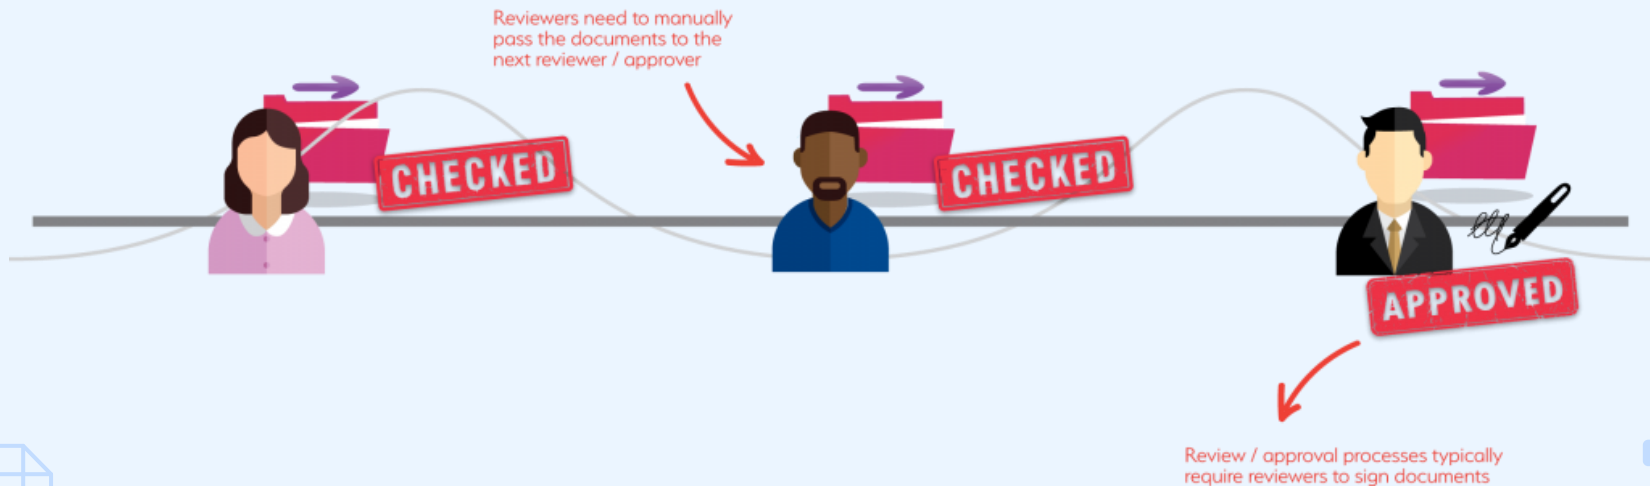




Kiểm soát các phiên bản WBS

- Nguyên tắc là không được hủy các phiên bản trước để quản lý được các vấn đề nảy sinh do sự thay đổi
- Các phiên bản cần có số hiệu và ngày tháng

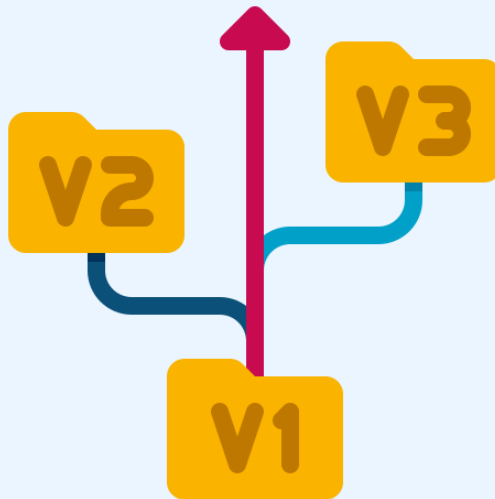



Thanks!



Do you have any questions?
